



Sundhedsbehandling bag murene


Landsdækkende sundhedssystem øger patientsikkerheden



Hvad kendetegner
sundheds-
behandlingen bag
murene?




Hvad var vores behov?

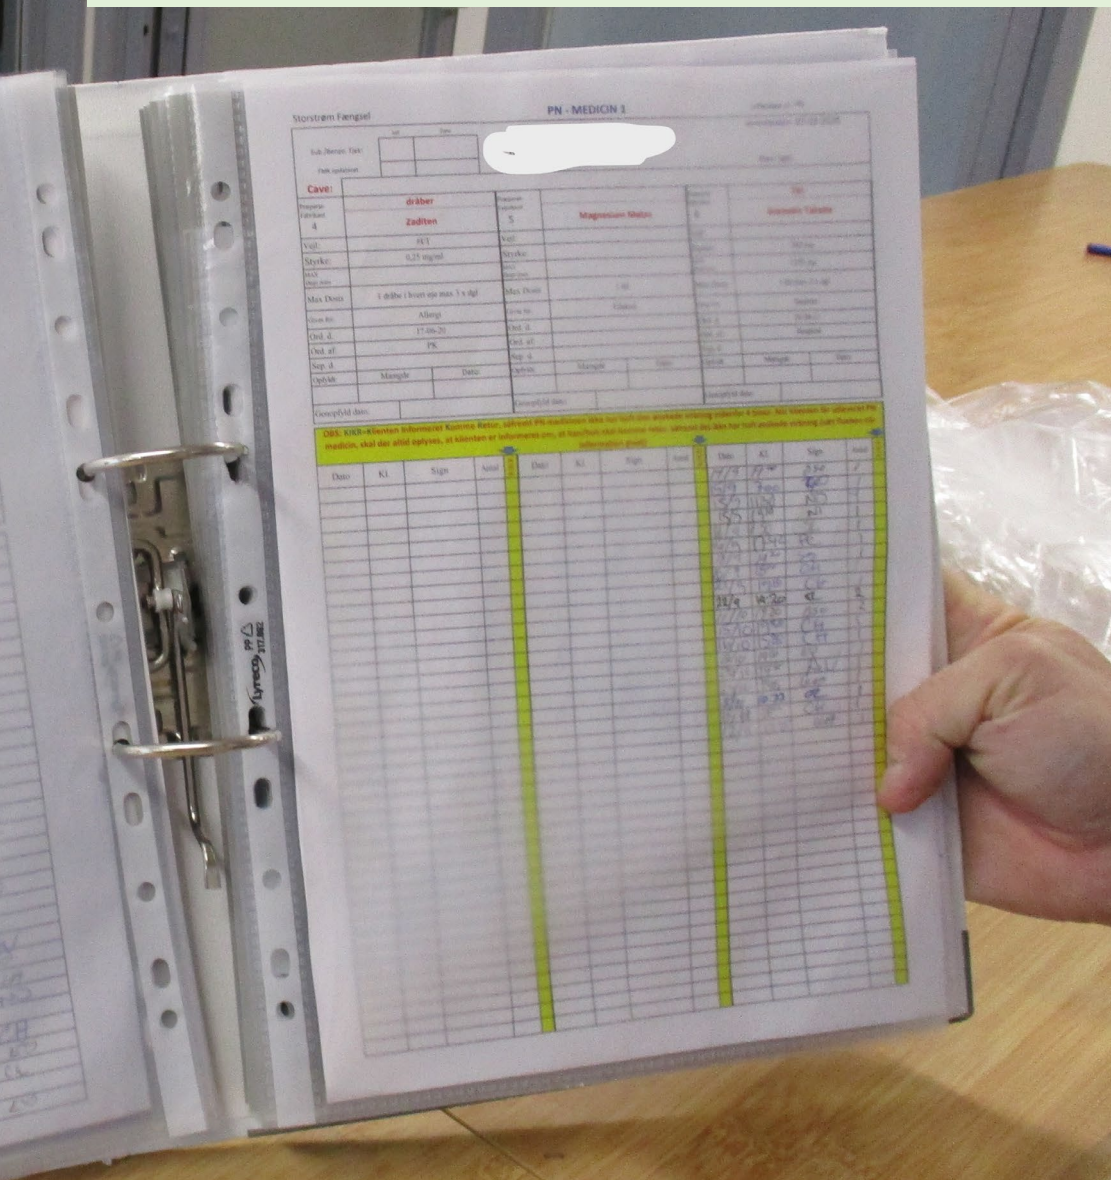

Hvad købte vi så?




Fase 1: Landsdækkende sundhedssystem

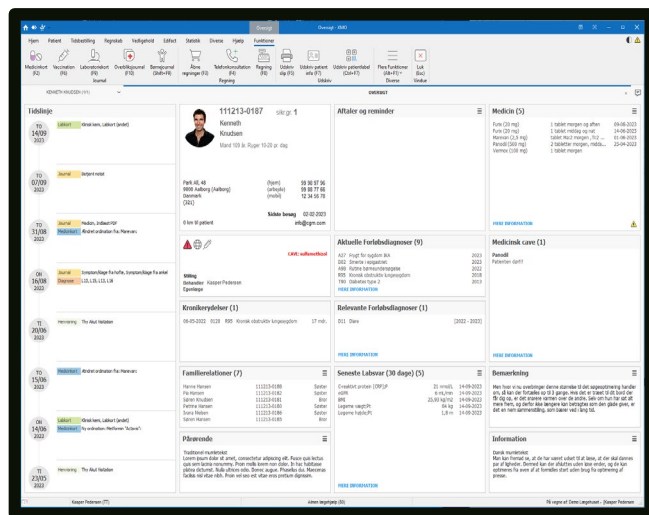

Fase 2: Håndterminal




Hvad købte vi så?

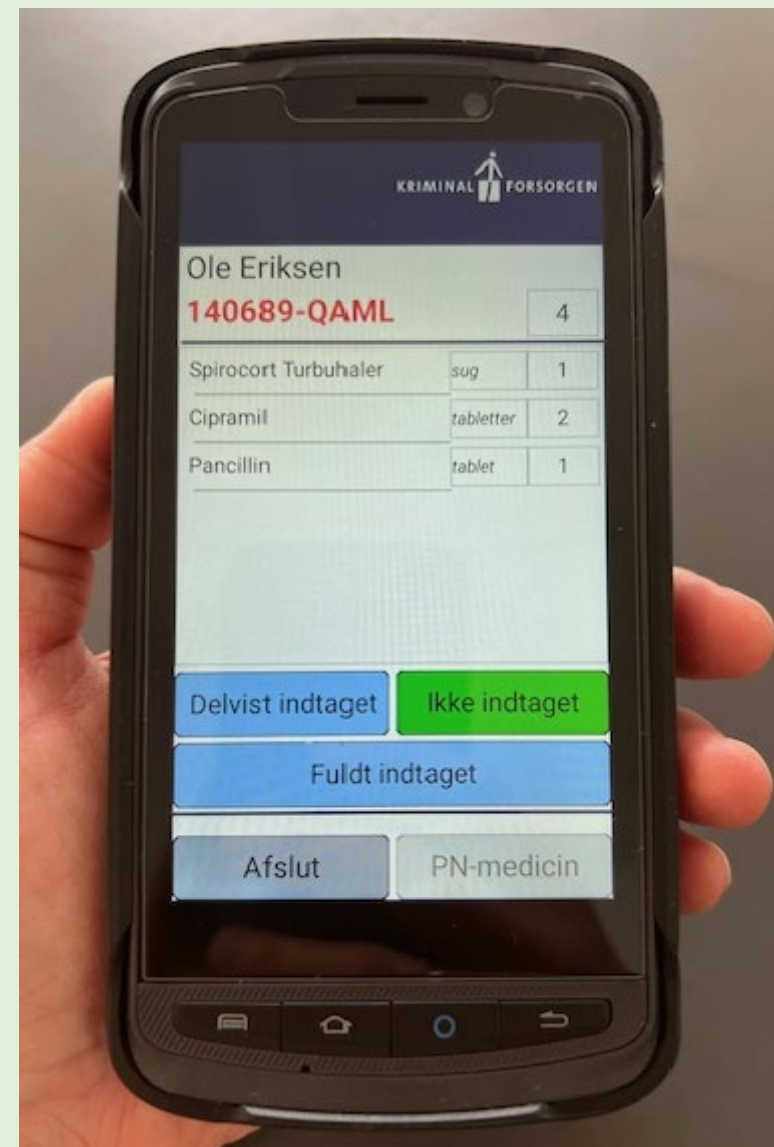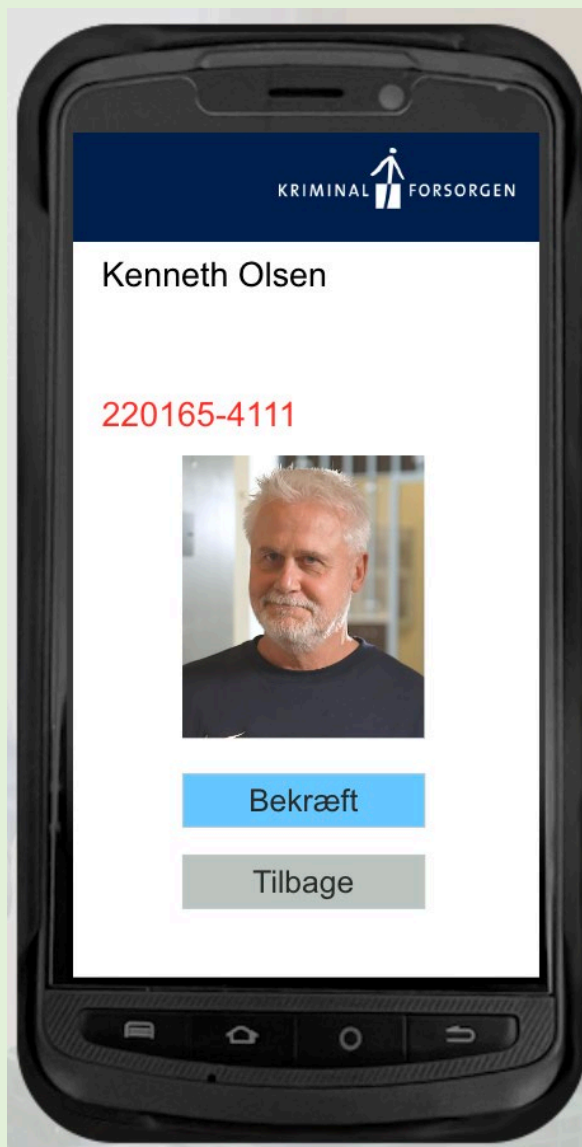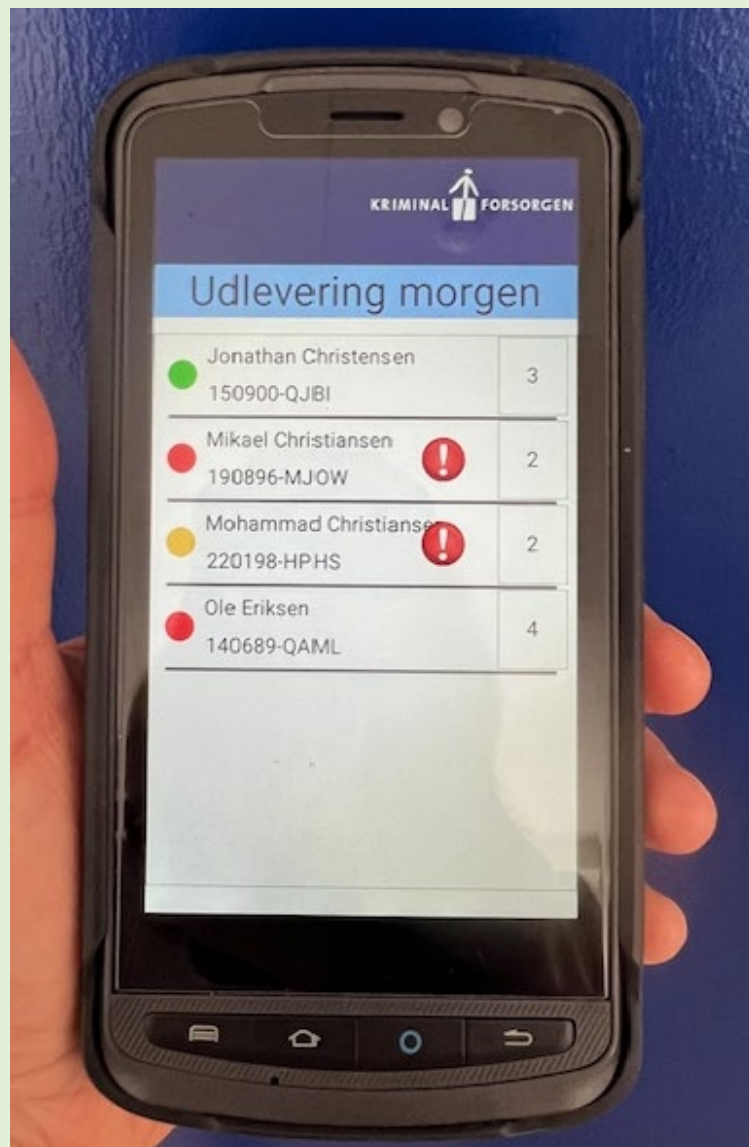

Tilfredshed med systemet: Nemt at bruge

Hvor tilfreds er du med at bruge håndterminalen ved udlevering af medicin?

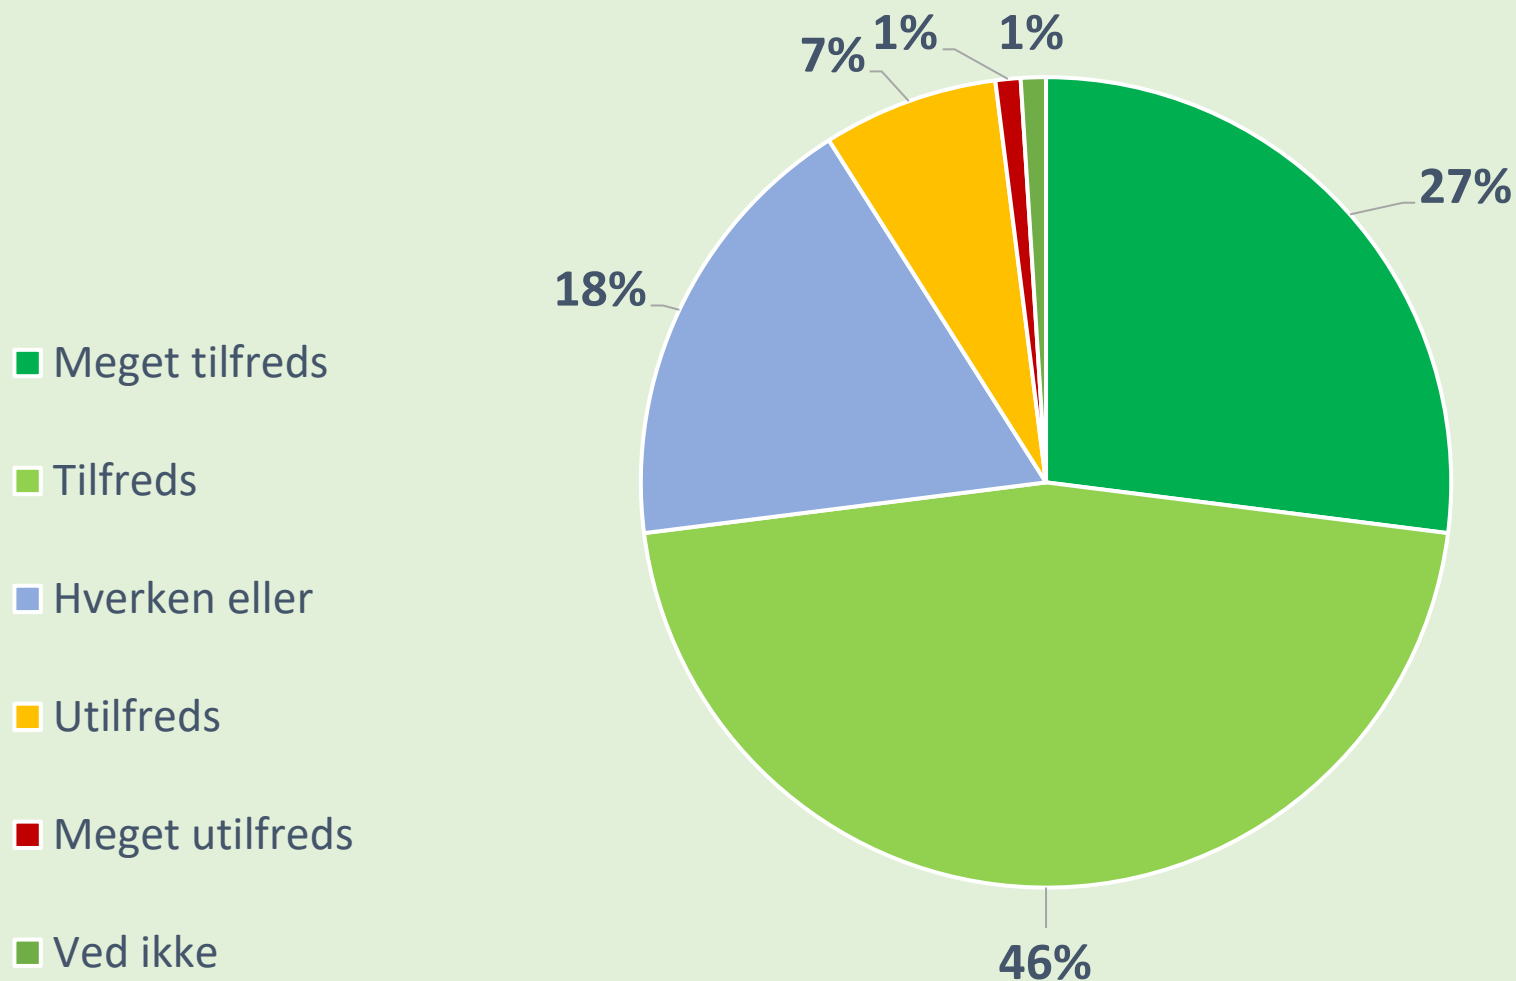

73 %

fængselsbetjentene er
tilfredse eller meget
tilfredse

8 %

fængselsbetjentene er
utilfredse eller meget
utilfredse

Kære KF-ledelse.

I skal alle have stor tak for jeres indsats med at forberede jeres personale til XMO og de nye håndterminaler og de udfordringer alle nok har været lidt bekymrede for i den forbindelse.

I har gjort et stort, godt og vigtigt arbejde for at få alle med, så betjentene var klædt bedst muligt på op til lanceringen i onsdags.

Jeg har ikke hørt én eneste rigtig og alvorligt ment negativ kommentar i forbindelse med udrulningen.

De udfordringer, der har været, er blevet formidlet videre af personalet på en løsningsorienteret og relevant måde, når de har oplevet dem.

Jeg har i hvert fald aldrig tidligere oplevet personalet tage imod ændringer på samme måde.

Tak!

Med venlig hilsen

Enhedschef, Københavns Fængsler



Styrelsen for Patientsikkerhed:

Ingen anmærkninger!

Hvorfor lykkedes vores projekt?



Start til slut: 2½ år

	2022			2023				2024				
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
KRAV TIL LØSNING												
Organisering af projekt	■ 01-05-2022 - 12-06-2022											
Krav	■ 13-06-2022 - 23-10-2022											
UDBUD												
Udbudsproces	■ 26-09-2022 - 31-01-2023											
Vurdering af krav	■ 12-12-2022 - 31-01-2023											
Indgåelse af kontrakt	■ 01-02-2023 - 28-02-2023											
FORANALYSE	■ 06-03-2023 - 30-04-2023											
FASE 1: LANDSDÆKKENDE SUNDHEDSSYSTEM												
Tilpasning	■ 01-05-2023 - 22-10-2023											
Implementering	■ 23-10-2023 - 31-12-2023											
FASE 2: HÅNDTERMINAL												
Tilpasning og pilot	01-01-2024 - 30-09-2024 ■											
Implementering	07-10-2024 - 31-01-2025 ■											

Fra start til slut: 2½ år

